

Elaborador: Marcelino Rodrigues Braga

Aprovador: Angela de Queiroz Pacheco


1. OBJETIVO

O objetivo do procedimento de Gerenciamento do Banco de Dados Histórico é apresentar as ferramentas e técnicas que foram identificadas como sendo as “melhores práticas testadas e comprovadas” que funcionam na “maioria dos projetos, na maioria das vezes”; fornecer uma sequência lógica ou racional mostrando quando essas ferramentas e técnicas seriam normalmente e habitualmente usadas e, em casos selecionados, mostrar onde encontrar informações adicionais sobre como usá-las ou aplicá-las.

Este procedimento representa um processo contínuo. Assim que novos dados são capturados, eles precisam ser analisados, avaliados e arquivados para uso imediato e também como referência para futuros projetos.

A seguir, está destacado o processo em questão no Fluxograma de Processos de Planejamento e Controle do Projeto.

Figura 1 - Processo destacado no Fluxograma de Processos de Planejamento e Controle do Projeto

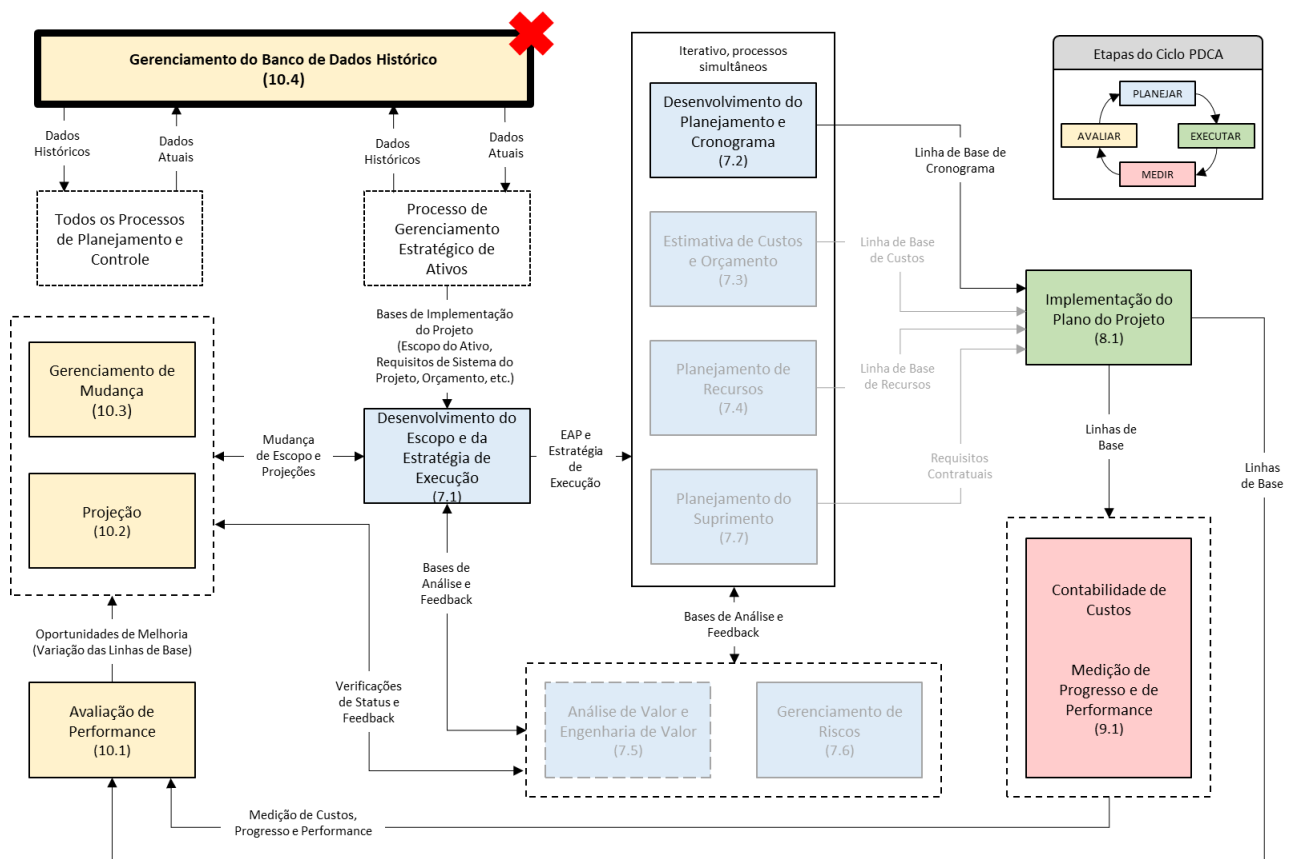

Fonte: Adaptado de H.L. Stephenson, 2015

Elaborador: Marcelino Rodrigues Braga**Aprovador:** Angela de Queiroz Pacheco

Para o construtor, isso se torna importante porque o mesmo utiliza as informações atuais como base para suportar propostas e projeções, o que significa que manter um banco de dados preciso e atualizado é essencial para a sustentabilidade do negócio.

2. AMPLITUDE

CRASA Infraestrutura S/A.

3. TERMINOLOGIA



Abreviaturas

- Não aplicável.

4. FLUXOGRAMA

Os Subprocessos estão destacados no Fluxograma dos Subprocessos de Planejamento e Controle do Projeto, apresentado a seguir:

Subprocessos Destacados no Fluxograma dos Subprocessos de Planejamento e Controle do Projeto

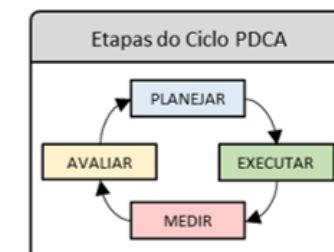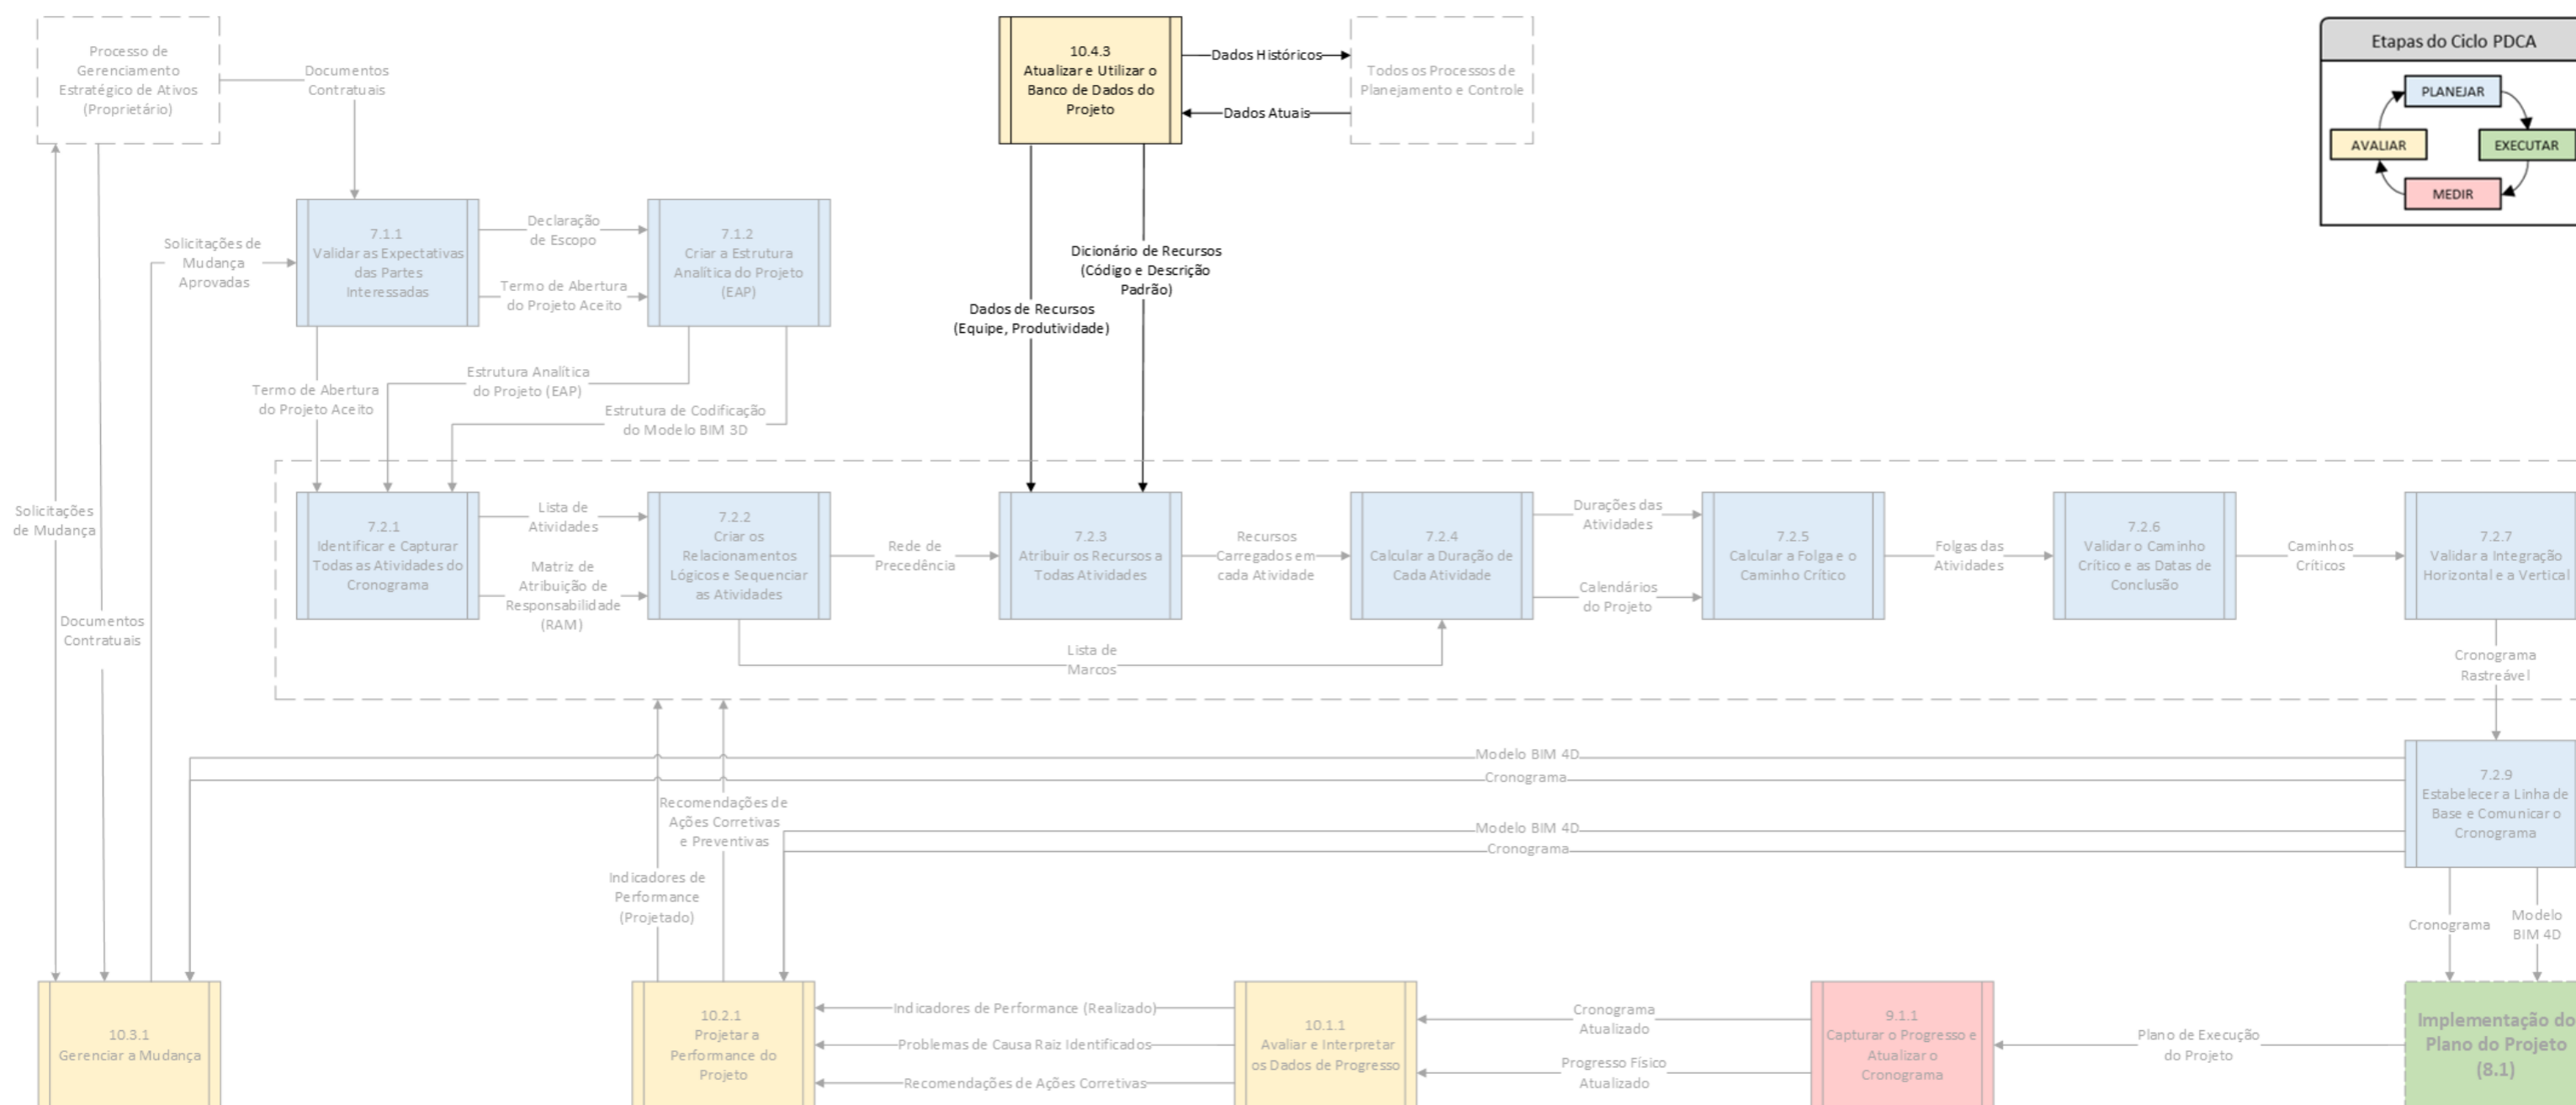

Elaborador: Marcelino Rodrigues Braga

Aprovador: Angela de Queiroz Pacheco

5. RESPONSABILIDADE

Código Subprocesso	Entregáveis	Engenharia de Custos				Gerenciamento do Projeto				
		Coordenador de Planejamento e Controle	Profissional de Planejamento e Cronograma	Profissional de Estimativa de Custos e Orçamento	Profissional de Controle de Custos	Gerência de Produção	Gerência de Engenharia	Gerência Administrativo-Financeiro	Coordenação de QSMS	Gerência do Projeto
10.4.3	Banco de Dados Atualizado do Sistema de Gerenciamento de Cronogramas	R	E	C	C	I	I	I	I	I
10.4.3	Banco de Dados Atualizado do Sistema de Gerenciamento de Documentação	R	E	C	C	I	I	I	I	I

E = Elaboração

R = Responsável

C = Consultado

I = Informado

6. DIRETRIZES

6.1. Atualizar e Utilizar o Banco de Dados do Projeto (10.4.3)

Ferramentas e Técnicas

- Gravar Dados no Banco de Dados Padrão;
- Buscar Dados no Banco de Dados Padrão.

Entradas

- Dados Atuais de Todos os Processos de Planejamento e Controle do Projeto.

Saídas

- Dicionário de Recursos (Código e Descrição Padrão);
- Dados de Recursos (Equipe, Produtividade);
- Dados Históricos de Todos os Processos de Planejamento e Controle do Projeto.

Elaborador: Marcelino Rodrigues Braga**Aprovador:** Angela de Queiroz Pacheco

Boas Práticas

- Os dados são armazenados no Sistema de Gerenciamento de Documentação considerando padrões para designar:
 - Tipos de Projetos;
 - Identificador do Projeto;
 - Fases do Ciclo de Vida do Projeto;
 - Tipos de Versões;
 - Área de Conhecimento.
- Os dados são armazenados no Sistema de Gerenciamento de Cronogramas considerando padrões para designar:
 - Tipos de Projetos;
 - Identificador do Projeto;
 - Fases do Ciclo de Vida do Projeto;
 - Tipos de Versões.

Padrões

- Padrão de Sistema de Codificação
PAD.CRASA.EGP.001
- Padrão de Sistema de Classificação da Maturidade do Projeto
PAD.CRASA.EGP.002

Formulários

Não aplicável.

Relatórios

Não aplicável.

Elaborador: Marcelino Rodrigues Braga**Aprovador:** Angela de Queiroz Pacheco

6.2. Sistemas

Devem ser utilizados, para controle e registro, os Sistemas:

- Primavera P6;
- SharePoint.

7. INFORMAÇÃO DOCUMENTADA

Atualizar e Utilizar o Banco de Dados do Projeto (10.4.3)

Identificação	Armazenamento	Proteção	Recuperação	Retenção	Disposição
Banco de Dados Atualizado do Sistema de Gerenciamento de Cronogramas	Controladoria	Primavera P6	Código	Permanente	Não aplicável
Banco de Dados Atualizado do Sistema de Gerenciamento de Documentação	Controladoria	SharePoint	Código	Permanente	Não aplicável
